

Regione Autonoma della Sardegna

COMUNE DI ESCOLCA

Provincia di CAGLIARI

REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA
COMUNITARIA DIFFUSA PER ANZIANI

PROGETTO ESECUTIVO

AGGIORNAMENTO:

ALLEGATO
F

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Sede Legale Via Ogliastro n°28 09121 CAGLIARI
Tel:070/273906
E-mail: ing.ireneosanna@gmail.com
pec: ireneo.sanna@ingpec.eu

PROGETTAZIONE:

A.T.P.
Ing. Ireneo Sanna
Studio Associato
ORGIANA & ORRU'
Ing. Jonathan della Marianna

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale
Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

PROGRAMMA DEI LAVORI

(Allegato al Piano Generale dei Controlli)

OGGETTO DEI LAVORI:

Realizzazione di una residenza comunitaria diffusa per anziani, mediante il recupero di tre distinti alloggi nel centro storico di Escolca.

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di Escolca

**COORDINATORE PER
L'ESECUZIONE:**

Ing. Ireneo Sanna

IMPRESA:

, lì

Firma _____


ID	Nome	Durata: 208,00 (%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fasi di lavoro											
2	F.01 - Rimozione di porzioni di intonaco	10g										
3	F.02 - Demolizione di opere in c.a.	8g										
4	F.03 - Rimozione controsoffitti; scarico con impiego di carriola e canale di discesa	4g										
5	F.04 - Rimozione di manto	10g										
6	F.05 - Rimozione serramenti esterni	3g										
7	F.06 - Rimozione serramenti interni	3g										
8	F.35 - Smontaggio di copertura in amianto cemento											
9	F.35.01 - Verifica della resistenza della copertura	1g										
10	F.35.02 - Accatastamento delle lastre in quota	1g										
11	F.35.03 - Imballaggio materiali contenenti amianto in lastre	1g										
12	F.35.04 - Calo al suolo del materiale contenente amianto in lastre	1g										
13	F.36 - Incapsulamento											
14	F.36.01 - Lavaggio delle fibre in copertura	1g										
15	F.36.02 - Applicazione del prodotto incapsulante	1g										
16	F.37 - Gestione dei rifiuti											
17	F.37.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio dei pacchi contenenti cemento	1g										
18	F.37.02 - Imballaggio ed allontanamento dei rifiuti contenenti amianto	1g										
19	Prescrizioni per lo smaltimento in discarica dei pacchi contenenti cemento amianto	1g										
20	F.07 - Rimozione lattoneria (grondaie, pluviali)	2g										
21	F.08 - Rimozione di macerie	3g										
22	F.09 - Realizzazione massetto su tavolato											
23	F.09.01 - Posa della rete di armatura	5g										
24	F.09.02 - Realizzazione del massetto gettato con autobetoniera e autopompa	8g										
25	F.10 - Realizzazione di solaio di piano terra con elementi prefabbricati tipo Iglù	12g										
26	F.11 - Scale in calcestruzzo											
27	F.11.01 - Esecuzione e rimozione del banchinaggio	4g										
28	F.11.02 - Getto del cls con autobetoniera, apparecchio di sollevamento e benna	4g										
29	F.11.03 - Allestimento e posa dell'armatura	4g										
30	F.11.04 - Getto con gru a torre e benna del cls prodotto con centrale di betonaggio	4g										
31	F.11.05 - Getto con autobetoniera e autopompa	3g										
32	F.11.06 - Vibrazione del getto	3g										
33	F.12 - Ricucitura di tratti murari esistenti in pietrame e mattoni, con rimozione delle	3g										
34	F.13 - Murature interne	14g										
35	F.14 - Posa della struttura portante in legno, del tavolato di sottotetto, della listellatura,	10g										
36	F.15 - Esecuzione dell'impermeabilizzazione con guaina asfalto-bituminosa	4g										
37	F.16 - Posa di rivestimenti ceramici o marmi a malta su pareti e pavimenti interni	10g										
38	F.17 - Posa di pietre naturali o artificiali e marmi a malta su pareti e pavimenti esterni	7g										
39	F.18 - Posa in opera di canalizzazioni in traccia											
40	F.18.01 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	3g										
41	F.18.02 - Posa in opera della canalizzazione e fissaggio con malta	3g										
42	F.19 - Inserimento fili	2g										
43	F.20 - Installazione corpi illuminanti	2g										
44	F.21 - Collegamento frutti e prima messa in funzione dell'impianto	2g										
45	F.22 - Realizzazione di traccia nella muratura con attrezzature manuali	3g										
46	F.23 - Posa condizionatori, pompe di calore	3g										
47	F.24 - Posa in opera di tubo in materiale multistrato per condizionamento	3g										
48	F.25 - Posa in opera di tubo in materiale plastico con giunzioni saldate/incollate (tipo	3g										
49	F.26 - Posa sanitari	4g										
50	F.27 - Ascensore oleodinamico											
51	F.27.01 - Impianto di illuminazione del vano											
52	F.27.01.01 - Impianto elettrico vano	3g										
53	F.27.01.02 - Installazione corpi illuminanti	2g										
54	F.27.02 - Collocamento in fossa delle guide di cabina, del pistone e delle travature di											
55	F.27.02.01 - Posizionamento delle guide all'interno della fossa	3g										
56	F.27.02.02 - Installazione guide	3g										
57	F.27.02.03 - Installazione arcata, e pistone	3g										
58	F.27.02.04 - Piombatura	3g										
59	F.27.03 - Collegamenti elettrici fra quadro di manovra e centralina, montaggio											
60	F.27.03.01 - Installazione macchina in sala macchine	2g										
61	F.27.03.02 - Posa delle canalizzazioni	2g										
62	F.27.03.03 - Impianto elettrico	2g										
63	F.27.04 - Controllo di tenuta del circuito idraulico, regolazioni delle porte, dei											
64	F.27.04.01 - Installazione porte di piano e cabina	1g										
65	F.27.04.02 - Controllo di tenuta del circuito (guarnizioni delle testate, flange,	1g										
66	F.27.05 - Smontaggio di ponteggio metallico fisso	1g										
67	F.27.06 - Montaggio di ponteggio metallico fisso	1g										
68	F.28 - Posa in opera di serramenti esterni	3g										
69	F.29 - Posa in opera di serramenti interni	3g										
70	F.30 - Posa del manto di copertura in tegole laterizie con malta	6g										
71	F.32 - Intonaci interni manuali	5g										
72	F.31 - Tinteggiature interne manuali	5g										
73	F.33 - Intonaci esterni manuali	4g										
74	F.34 - Tinteggiature esterne manuali	5g										

[illegible]


[illegible]

[illegible]

11811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315

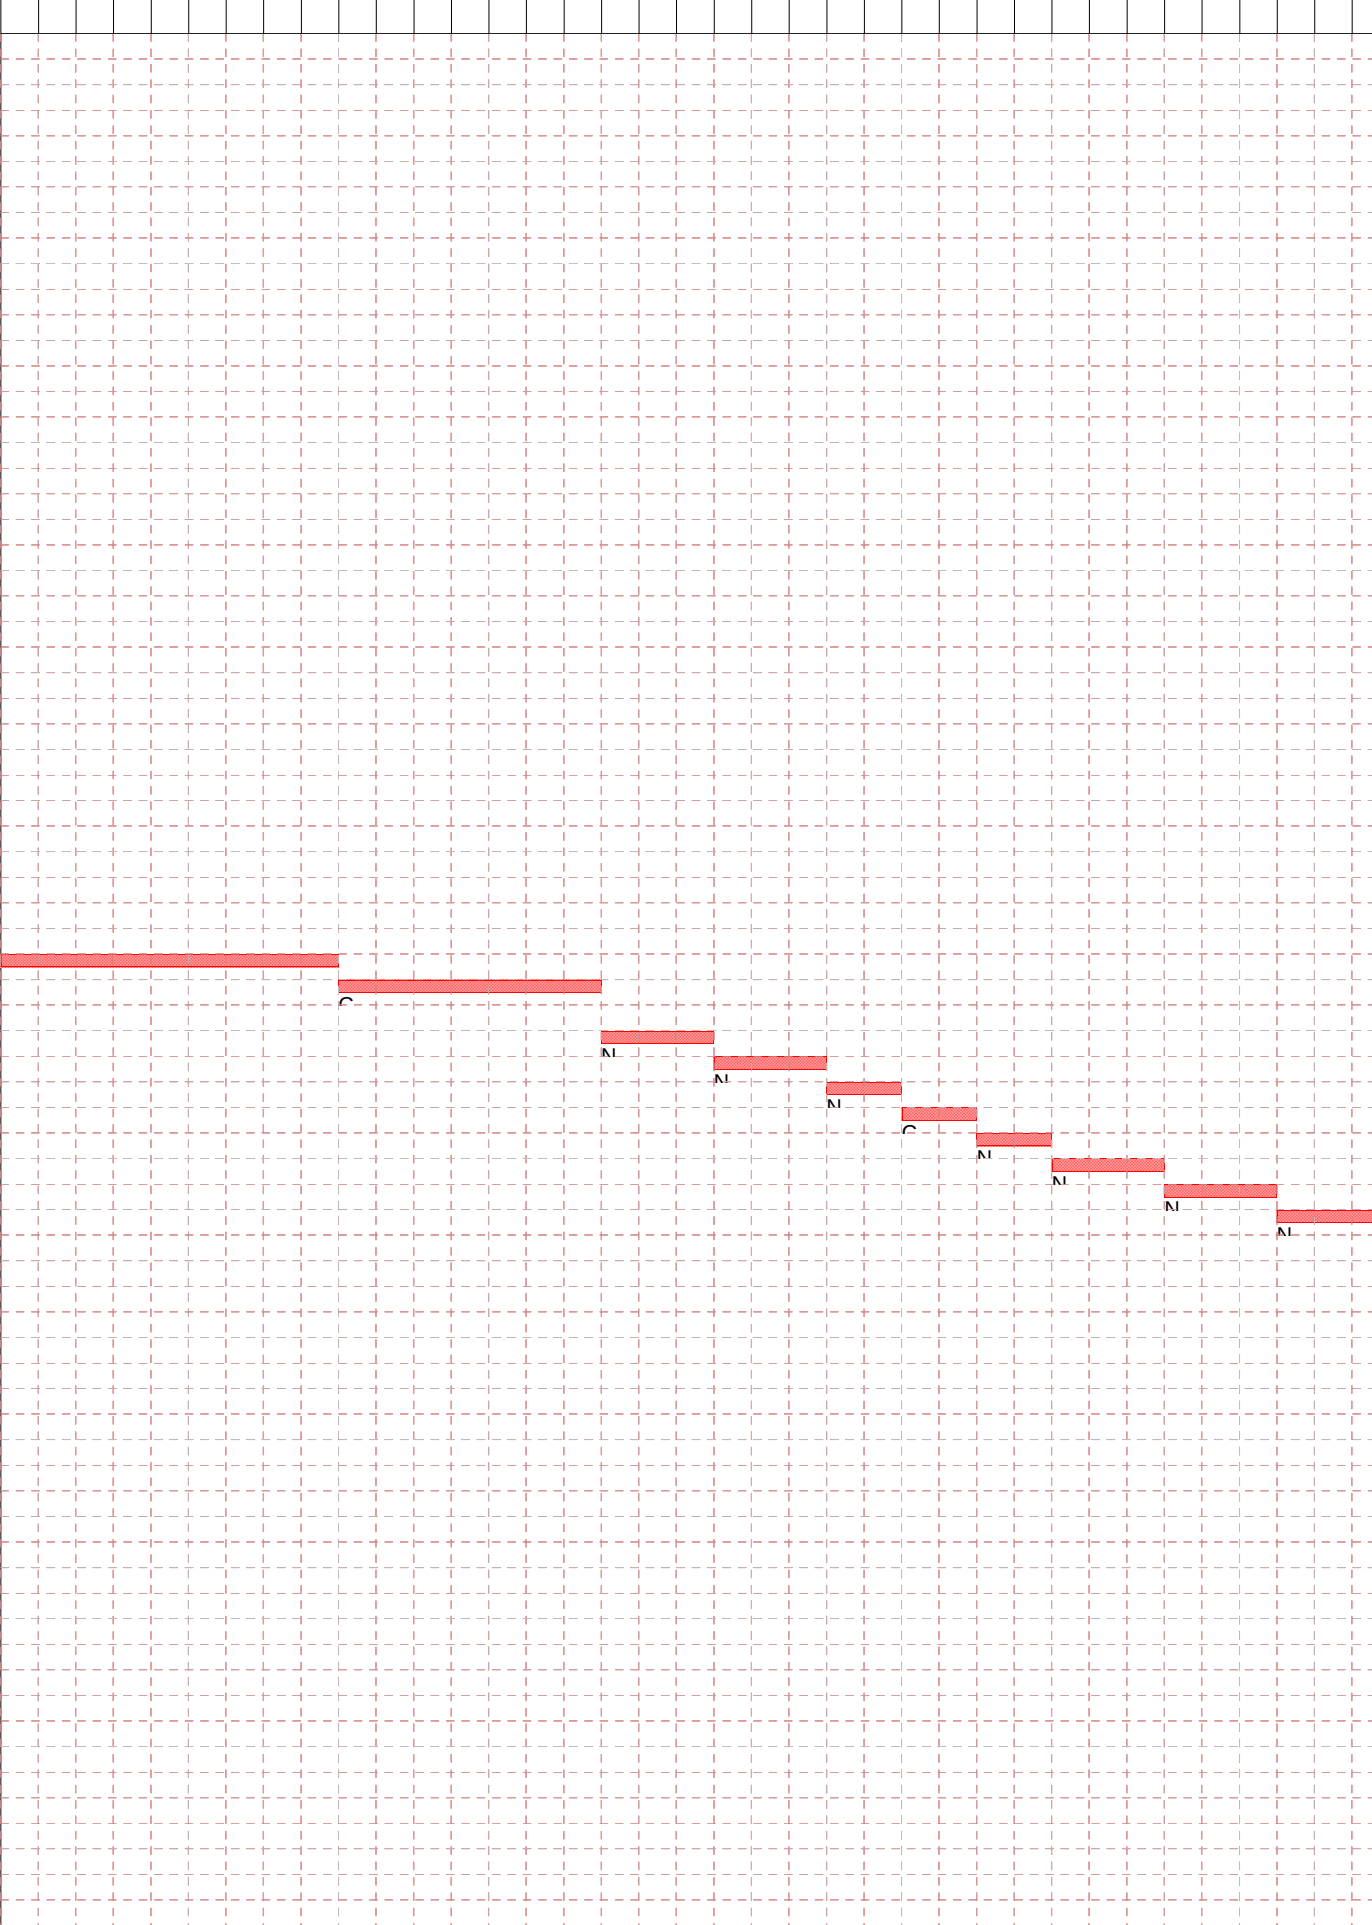

15415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919

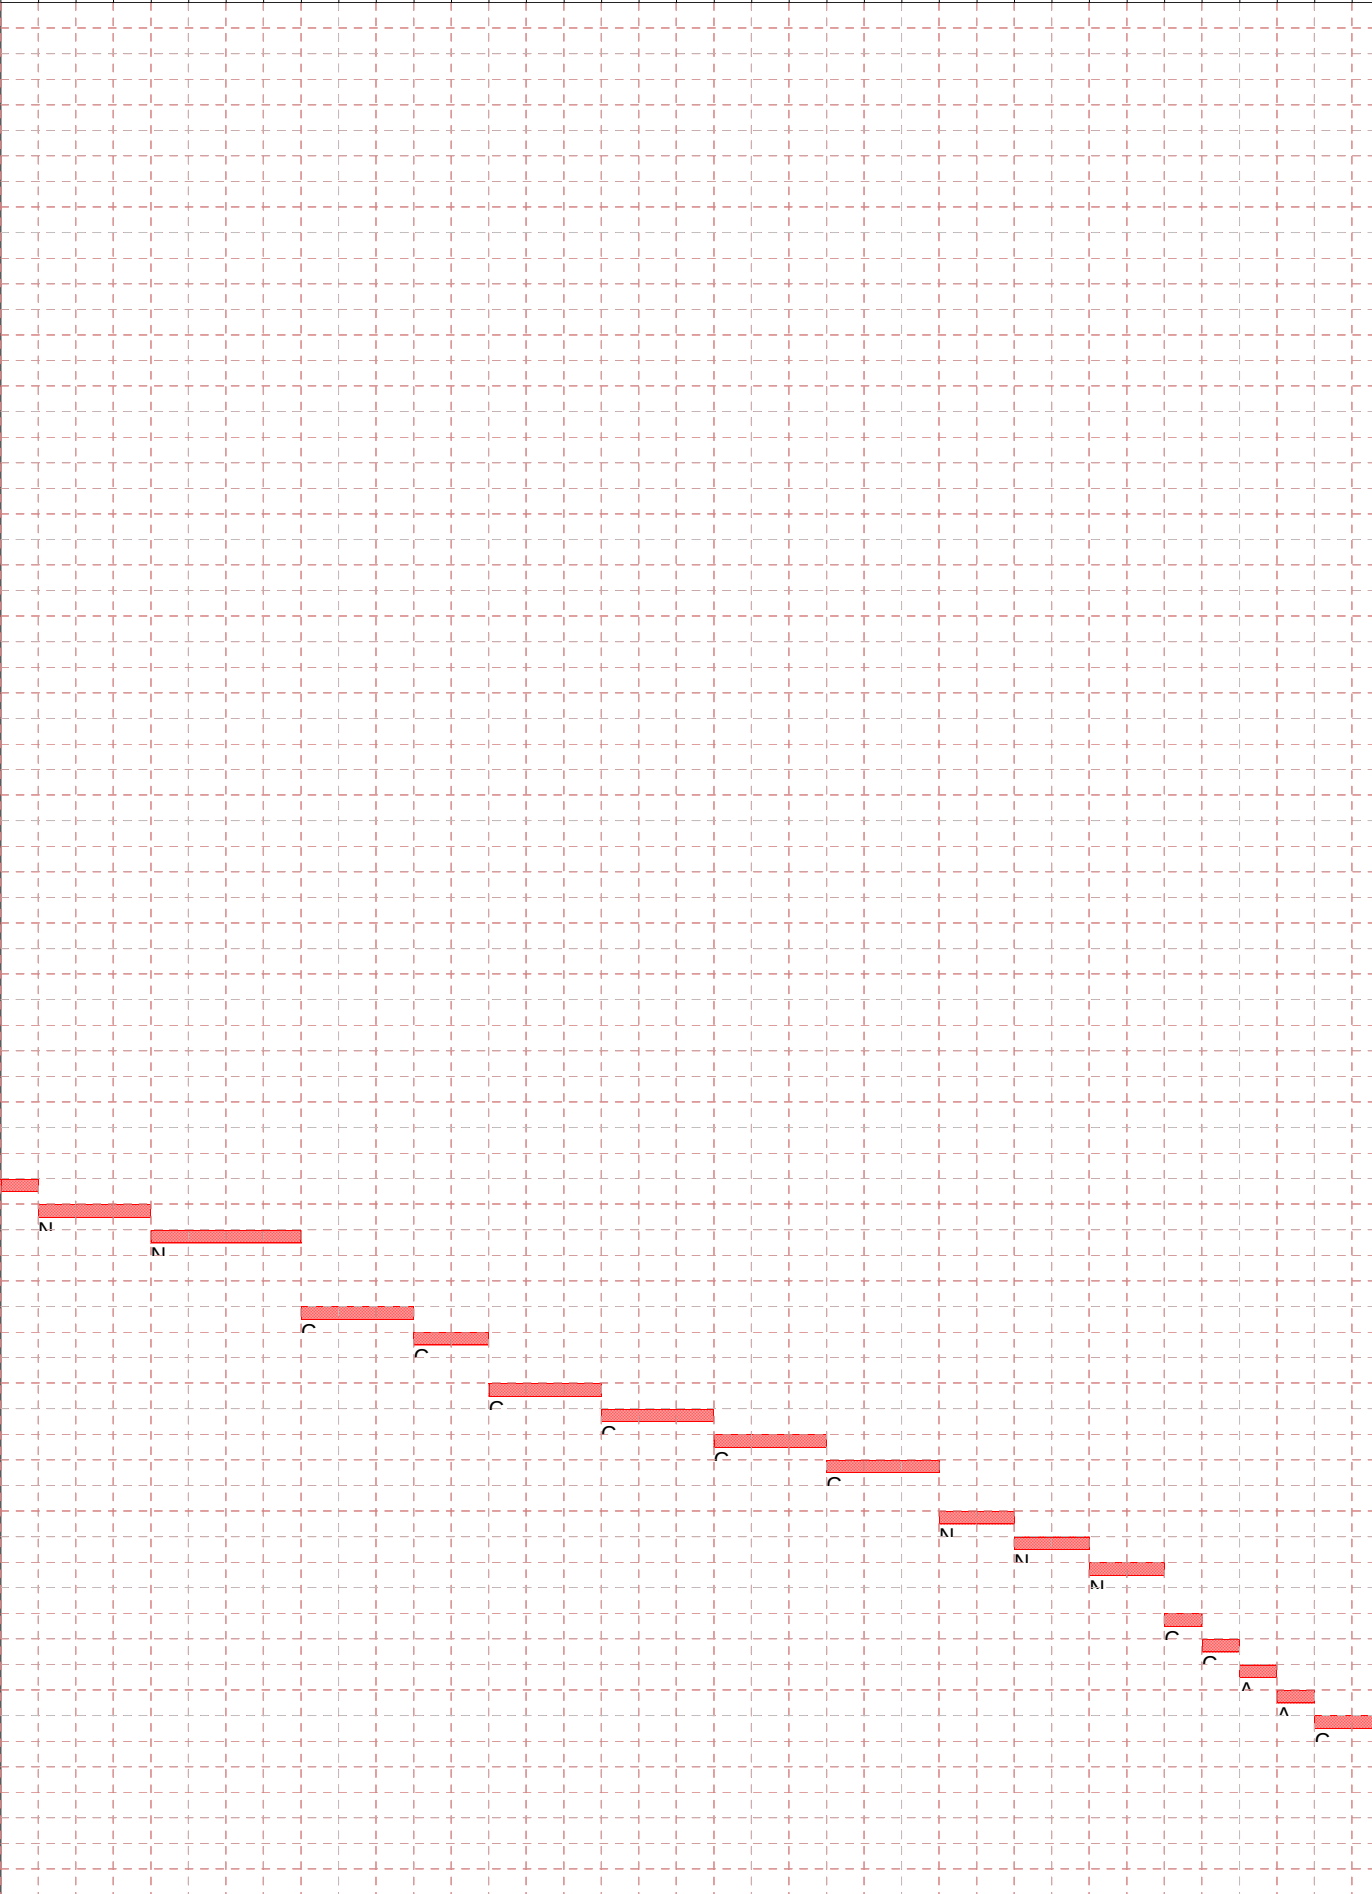

19019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522

